Bilag B - Generell Tidsplan GTP - Nydalen

Generell Tidsplan GTP Wed 06.05.09

Sofienlund
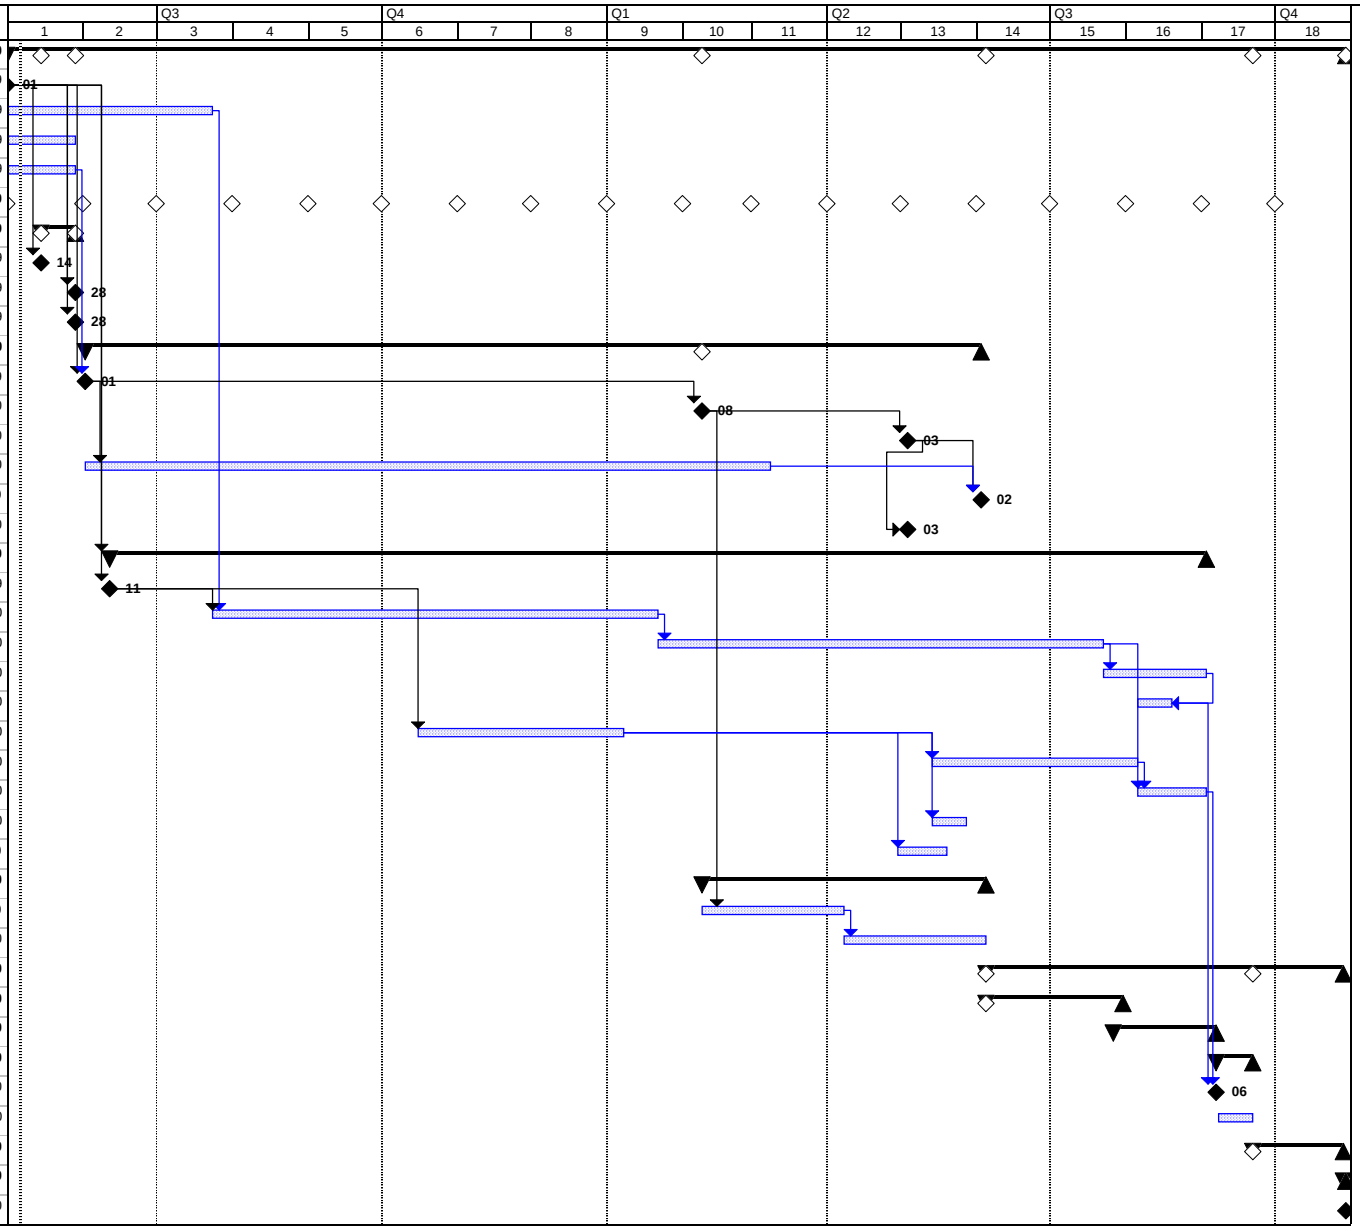
ID	Task Name	Resourc	Duration	Early Start	Early Finish
1	**Prosjektutvikling**	**4.02.08**	**391 days**	**Fri 01.05.09**	**Fri 29.10.10**
2	Effektiv kontrakt dato	Alle	0 days	Fri 01.05.09	Fri 01.05.09
3	Detaljplaner		60 days	Fri 01.05.09	Thu 23.07.09
4	Finansiering		20 days	Fri 01.05.09	Thu 28.05.09
5	Forespørsler el-mek		20 days	Fri 01.05.09	Thu 28.05.09
6	**Månedsrapport**		**370 days**	**Fri 01.05.09**	**Fri 01.10.10**
25	**Fase 1 - Design**		**10 days**	**Thu 14.05.09**	**Thu 28.05.09**
26	Fremdriftsplan DTS	BH	0 days	Thu 14.05.09	Thu 14.05.09
27	Hoveddata (hvis endringer)	BH	0 days	Thu 28.05.09	Thu 28.05.09
28	Konsept tegninger for godkjenning	TB	0 days	Thu 28.05.09	Thu 28.05.09
29	**Fase 2 - Fabrikasjon og levering av utstyr**		**262 days**	**Mon 01.06.09**	**Wed 02.06.10**
30	Bestilling ev el-mek pakke	D4	0 days	Mon 01.06.09	Mon 01.06.09
31	Innløpsrør	D4	0 days	Mon 08.02.10	Mon 08.02.10
32	Hovedventil, ringledning & turbinhus	D4	0 days	Mon 03.05.10	Mon 03.05.10
33	Generator	D4	200 days	Tue 02.06.09	Mon 08.03.10
34	Hydrauliggaggr. & løpehjul	D4	0 days	Wed 02.06.10	Wed 02.06.10
35	Apparat-, hj. & kontrollanlegg	D4	0 days	Mon 03.05.10	Mon 03.05.10
36	**Fase 3a - D1 Anlegg**		**320 days**	**Thu 11.06.09**	**Thu 02.09.10**
37	Kontrahering		0 days	Thu 11.06.09	Thu 11.06.09
38	Adkomstvei opp		130 days	Fri 24.07.09	Thu 21.01.10
39	Tunnel	D1	130 days	Fri 22.01.10	Thu 22.07.10
40	Demning	D1	30 days	Fri 23.07.10	Thu 02.09.10
41	Inntak	D1	10 days	Fri 06.08.10	Thu 19.08.10
42	Rørgate 1a Grav,legg,omfyll,pynt	D1	60 days	Fri 16.10.09	Thu 07.01.10
43	Rørgate 1b Grav,legg,omfyll,pynt	D1	60 days	Fri 14.05.10	Thu 05.08.10
44	Rørgate 2 i Tunell legg	D1	20 days	Fri 06.08.10	Thu 02.09.10
45	Kraftledning -> K4 del 2	D1	10 days	Fri 14.05.10	Thu 27.05.10
46	Generell opynting	D1	14 days	Fri 30.04.10	Wed 19.05.10
47	**Fase 3b - D3 Bygging**		**84 days**	**Tue 09.02.10**	**Fri 04.06.10**
48	Kraftstasjon-fundament	D3	42 days	Tue 09.02.10	Wed 07.04.10
49	Kraftstasjon-overbygg	D3	42 days	Thu 08.04.10	Fri 04.06.10
50	**Fase 3c - D4 El-mek montasje**	**TB**	**104 days**	**Fri 04.06.10**	**Thu 28.10.10**
51	**Montasje og innstøping**		**40 days**	**Fri 04.06.10**	**Fri 30.07.10**
59	**El-mek montasje**		**30 days**	**Tue 27.07.10**	**Mon 06.09.10**
67	**Forberedelser**		**11 days**	**Mon 06.09.10**	**Tue 21.09.10**
68	Trykksetting	Alle	0 days	Mon 06.09.10	Mon 06.09.10
69	Tørrprøving	EM	10 days	Wed 08.09.10	Tue 21.09.10
70	**Prøving og igangkjøring**		**27 days**	**Tue 21.09.10**	**Thu 28.10.10**
76	**Fase 4 - Garantiperiode (2år)**		**1 day**	**Fri 29.10.10**	**Fri 29.10.10**
79	Overtakelse	Alle	0 days	Fri 29.10.10	Fri 29.10.10
